

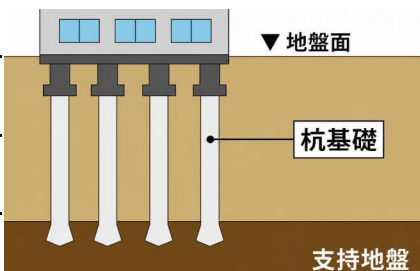






工事のお知らせ

工事名	準用河川旧天明新川改修工事（3号堰改築）	工事場所	熊本市南区 御幸木部町 地内
発注者	 熊本市 都市建設局 土木部 河川課	工期	令和7年12月10日 ～ 令和8年9月30日
工事の進捗状況（%）		地域のみなさまへ	
		<p>5月より、可動堰本体工に伴う既製杭工事を行ってまいります。</p> <p>工事では、大型の機械を搬入し、杭の施工を行う予定です。施工期間は、7月中旬頃までを見込んでおります。</p> <p>田植えの時期と重なるため、地域の皆様にはご不便をおかけすることもあるかと思いますが、川の水を汚さないよう、濁水対策や環境美化に十分配慮しながら作業を進めてまいります。</p> <p>また、工事用道路を通行される際は、安全確保のため、徐行運転へのご協力をお願いいたします。</p> <p>何かお気づきの点やご不明な点がございましたら、現場事務所までお気軽にご連絡ください。工事完成までの間、何卒ご理解とご協力のほど、よろしくをお願いいたします。</p>	
4月の工程			
可動堰本体工	既製杭工	擁壁、堰本体構造物を支えるための基礎杭を地中に設置します。	
		基礎杭はあらかじめ工場で製作し、現場でつなぎ合わせ建て込みます。	
			
工事の写真や動画がみれます  			


履行写真

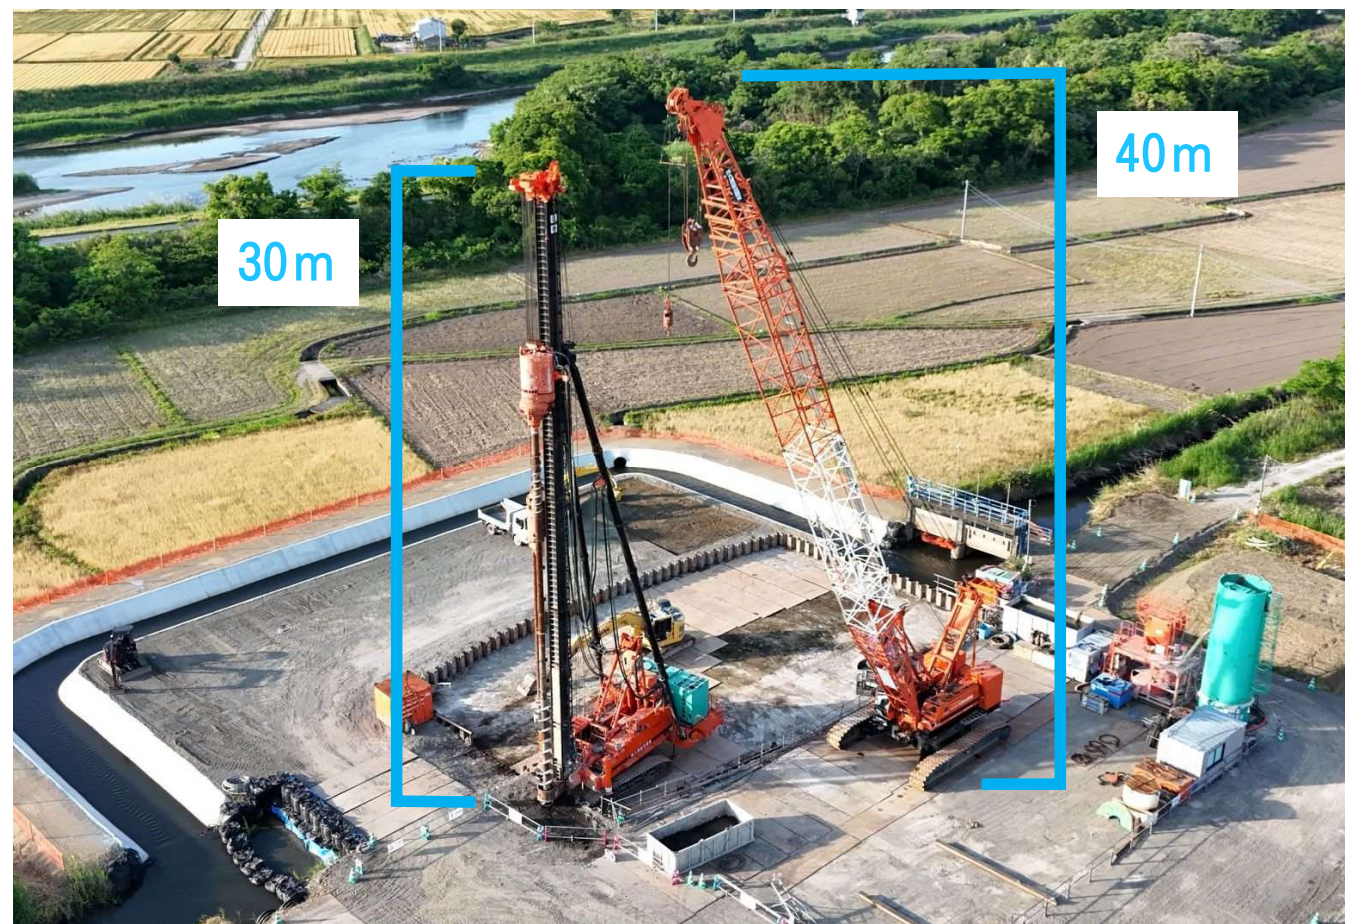

工事のお知らせ

工事名	準用河川旧天明新川改修工事（3号堰改築）	工事場所	熊本市南区 御幸木部町 地内
発注者	 熊本市 都市建設局 土木部 河川課	工期	令和7年12月10日 ~ 令和8年9月30日

工事の進捗状況（%）



地域のみなさまへ

先月に引き続き、現在、**地盤改良工事**を行っております。
工事期間中は、騒音・振動の抑制に努めるとともに、現場周辺の環境美化にも取り組み、地域の皆様にできる限りご迷惑をおかけしないよう作業を進めております。また、日頃より工事へのご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

今後、地盤改良工事が完了しましたら、**基礎杭を設置する工事**へと進んでまいります。工事の内容により、大型建設機械が出入りする日もございますが、引き続き安全管理を徹底し、騒音・振動や周辺環境に配慮しながら施工してまいります。

何卒、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。


工事の写真や動画がみれます😊



4月の工程

地盤改良工



構造物が沈下しないように基礎地盤を改良します。

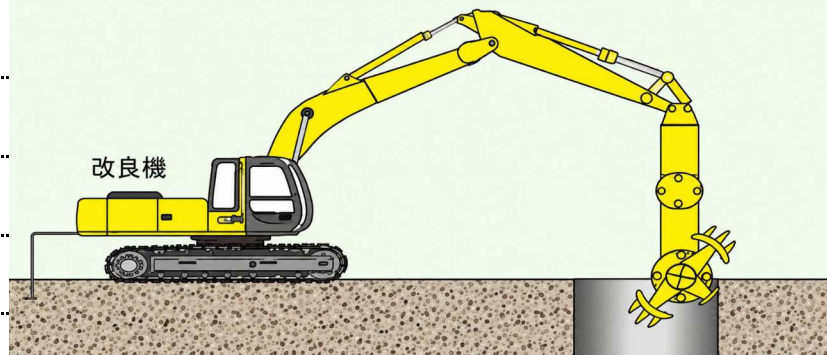

履行写真



工事のお知らせ

工事名	準用河川旧天明新川改修工事（3号堰改築）	工事場所	熊本市南区 御幸木部町 地内
発注者	 熊本市 都市建設局 土木部 河川課	工期	令和7年12月10日 ~ 令和8年9月30日
工事の進捗状況（%）		地域のみなさまへ	
		初めまして。昇・天栄建設工事共同企業体にて現場代理人を務めます、 上野 と申します。この度、熊本市発注の公共工事を請け負うこととなりました。 工事期間中は、地元の皆様にご不便やご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、安全を第一に、円滑な工事完成に向けて誠実に取り組んでまいります。また、 自治会長様、農区長様とも適宜連絡・報告を行い、地域の皆様が安心して生活できるよう努めてまいります。 工事に関してお気づきの点やご相談などがございましたら、できる限り対応させていただきますので、お気軽にお声かけください。 地域の皆様に安心していただけるよう、誠意を持って工事を進めてまいります。 工事完成までの間、何卒よろしくお願いいたします。	
3月の工程			
仮設工 仮水路工	工事を行う箇所を避けるように川の切り回し用水路を設置します。		
仮設工 作業ヤード整備工	工事用機械や資材を配置するためのヤードを整備します。		

履行写真

